

Fassadenbegrünung


Des Jahres 2021

ENNI Moers Verwaltung Ostfassade, Innenhof & Foyer

Pflanzplan Ostfassade



Legende: Flächen



Legende: Gruppen und Streifen



ENVI-Maßstab	1:100
Projektname	Umfeldentwicklung - Pflanzplan Ostfassade - Versorgungsplan
Architekt	BELKE
Datum	2020

Darstellung Ostfassade - Omegaprofilstruktur und technische Versorgungspunkte



ENVI-Maßstab	1:100
Projektname	Umfeldentwicklung - Pflanzplan Ostfassade - Versorgungsplan
Architekt	BELKE
Datum	2020

- Projektentwicklung 2019 - 2020
- Pflanzplan Model Bemusterung










- Auftragserteilung Mitte 2020
- ENNI Moers Verwaltung Rohbau Betonfertigteil





Anschluss der Fassadenbegrünung an die Nord-/Südfassade

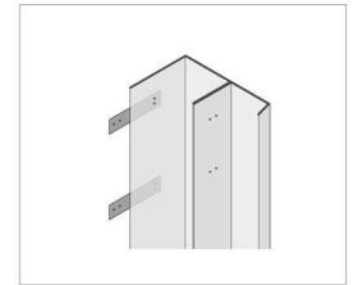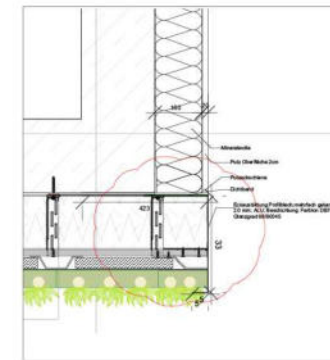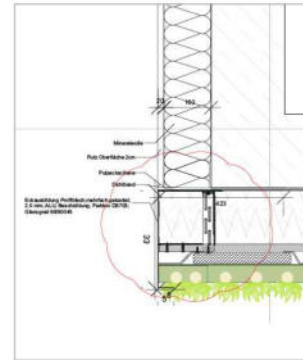

Index	Datum	Änderung
1	14.04.2021	Eckprofil Anpassung
2	14.12.2020	Abzuchtprofil geändert - 33 cm
3	16.11.2020	Platzhöhe

BAUVORHABEN
ENNI Moers

AUFTRAGGEBER
Hünthausen Bauunternehmen GmbH
Bäckerstrasse 4
517079 Siegen

PLANUNG
Dipl. Ing. Clemens Balke

PROJEKT
Dokumentationsplan - Anschluss WDVS
Ostfassade



PLANKUMMER 2013 INDEX 5

PLANGRÖSSE ISO A3

MAßSTAB 1:100 PLAN

DATUM DRUCK 27.07.2021 2013

DATUM LÖSUNG 27.07.2021

ZEICHNER L.K. GEPRÜFT

- Rahmen und Konstruktionselemente Fensterlaibungen
- Montagemuster Erstellen



- Bauleitung, Einfließen von Änderungen, Dokumentation
- Maßanpassungen, Individuelle Änderungen



- Winterpause
- Nutzung des Zeitraumes für die Erstellung Bewässerung und Versorgungsleitungen





- Mineralische Dämmung 18 cm Installation
- Ejoyt Dämmhalter





- Fensterlaibungen werden angeliefert Oberflächen Beschichtet
- Montage Raumoptimiert unter Bestand des Gerüsts
- Abdichtung der Anschlußbereiche





- Abschluß Montage UK, Dämmung, Omegaprofile und Fensterlaibungen Juni 2021
- Abrüsten Durchführung Hausanschluß und Grundleitungen





- Anlieferung Vegetationselemente Montagebeginn
- Vorproduktionszeitraum 6 – 8 Monate



- Montage mit Bühne ohne Gerüst



- Anschluß Bewässerung und Steuerleitungen
- Fertigstellung Foyer und Innenhof







- Fertigstellung Innenhof Ende Juli 2020





- Fertigstellung Ostfassade Probelauf



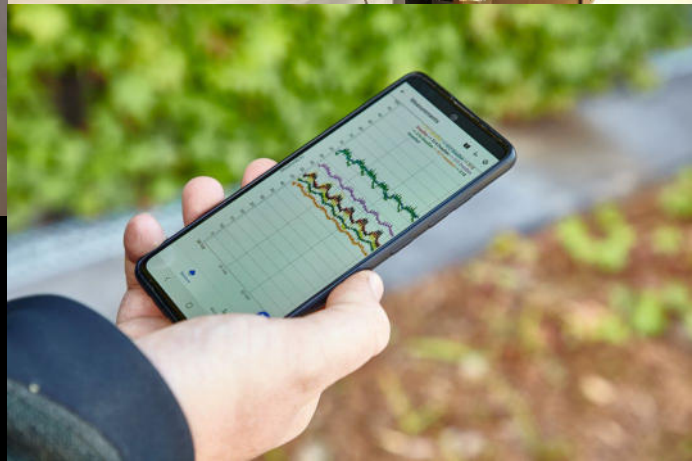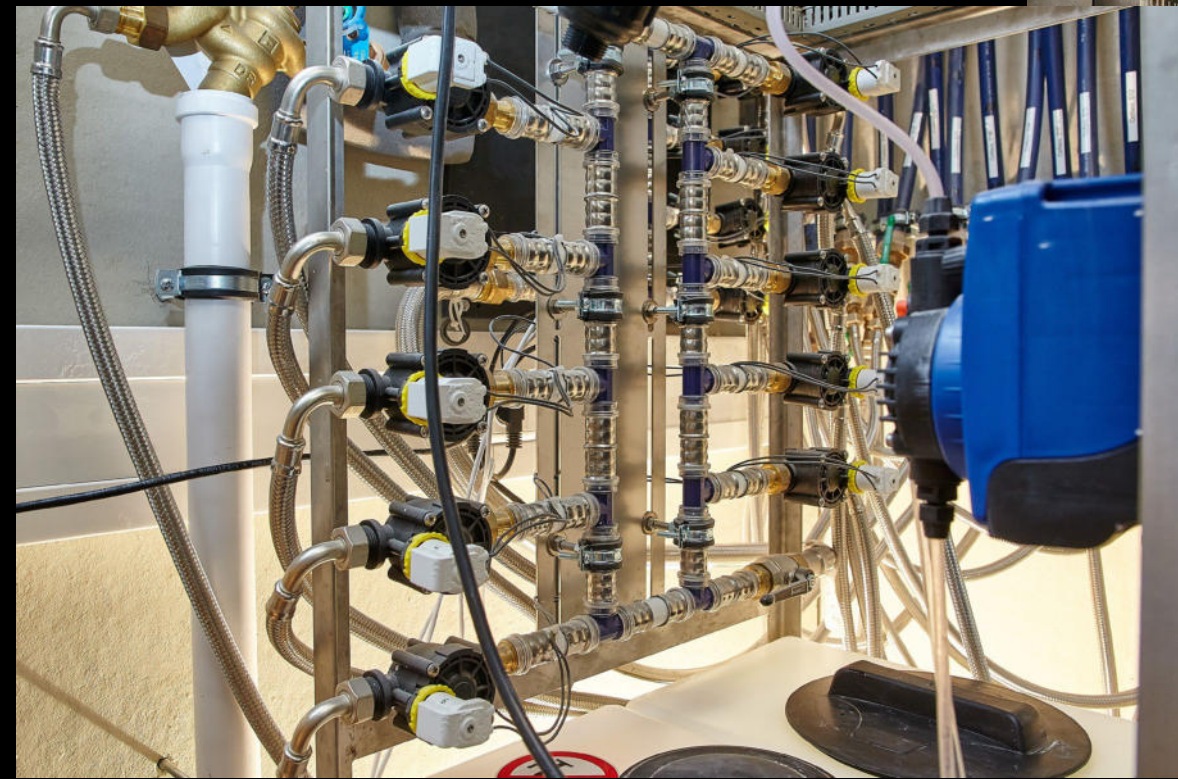

- Optimierung der Einstellungen
- Online Monitoring via Handy APP



- Pflege der Vegetation Unterhaltungsarbeiten



- Pflege und Kontrollmaßnahmen Anwuchsgewährleistung



Vielen Dank
Aufbruch in eine neue Dimension

